



شركة طرق الرياض للمقاولات  
RIYADH ROADS CONTRACTING CO.



وزارة الإسكان  
MINISTRY OF HOUSING



مكتب رمك للاستشارات الهندسية  
Office Ramak For Engineering Consultancy  
تصميم - إشراف - تخطيط عمراني - إدارة مشاريع

المواصل: مدير المشاريع: 0544711279 الإدارة: 0566152166  
info@ramakcompany.com

## Works Inspection Request - WIR

طلب إستلام أعمال

|                    |                              |           |                      |
|--------------------|------------------------------|-----------|----------------------|
| MIR Serial Number: | ASPHALT WEARING COURSE       | طلب تسليم | الرقم التسلسلي: 0000 |
| Date               | ٢٠٢٤/٠٥/١٩                   |           | التاريخ              |
| Location           | جدة                          |           | المنطقة              |
| Project Title      | مشروع تلال الغروب            |           | إسم المشروع          |
| Consultant         | مكتب رمك للاستشارات الهندسية |           | الإستشاري            |
| Contractor :       | شركة طرق الرياض للمقاولات    |           | المقاول              |

### Part A: By the Contractor:

الجزء (أ): يتم إستكماله من خلال المقاول

#### Attachments (tick as appropriate)

المرفقات

|                                                                                                    |                                                                             |                                                                                       |                                                 |                                               |                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Sketch attached to show the location(s)<br>كروكي توضيحي للموقع | <input type="checkbox"/> Inspection Check list<br>قائمة الفحص               | <input type="checkbox"/> Surveyor Field Sheet (if any)<br>سجل إستلام الأعمال المباحية |                                                 |                                               |                                                |
| <input type="checkbox"/> Approved Shop Drawing<br>الرسومات التنفيذية المعتمدة                      | <input type="checkbox"/> Test Reports (if any)<br>تقارير إختبارات (إن وجدت) | <input type="checkbox"/> Others(state)<br>أخرى                                        |                                                 |                                               |                                                |
| Discipline: التصنيف                                                                                | <input type="checkbox"/> Civil<br>إنشائي                                    | <input type="checkbox"/> Architectural<br>معماري                                      | <input type="checkbox"/> Mechanical<br>ميكانيكا | <input type="checkbox"/> Electrical<br>كهرباء | <input type="checkbox"/> Other (state)<br>أخرى |

#### Description of Works to be inspected and / or tested:

وصف الأعمال المطلوب تسليمها

### ASPHALT WEARING COURSE

شارع 04

بلوك 11

#### Works Quantity:

We certify that these works has been executed in accordance with the Contract Specifications and Approved Drawings  
أشهاد بأن الأعمال المنجزة أعلاه نفذت حسب مواصفات العقد وحسب المخططات المعتمدة

|       |        |           |          |             |                 |       |            |          |
|-------|--------|-----------|----------|-------------|-----------------|-------|------------|----------|
| Name: | الاسم: | Signature | التوقيع: | Designation | المسمى الوظيفي: | Date: | 19/05/2025 | التاريخ: |
|-------|--------|-----------|----------|-------------|-----------------|-------|------------|----------|

### Part B: By the Consultant:

الجزء (ب): يتم إستكماله من خلال الإستشاري

#### Site Inspector's Comments:

ملاحظات القائم بالإستلام

|       |        |           |          |             |                 |       |  |          |
|-------|--------|-----------|----------|-------------|-----------------|-------|--|----------|
| Name: | الاسم: | Signature | التوقيع: | Designation | المسمى الوظيفي: | Date: |  | التاريخ: |
|-------|--------|-----------|----------|-------------|-----------------|-------|--|----------|

#### Witnessed Site Test Results (if any):

نتائج إختبارات الموقع (إن وجدت)

☒

Passed

مقبول

☐

Failed

مرفوض

☐

N/A

لا يوجد

#### Resident Engineer Final Comments & Decision:

ملاحظات مدير المشروع - إستشاري

|                                                       |                                                                   |                                                                                          |                                            |       |            |          |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|------------|----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Approved<br>يعتمد | <input type="checkbox"/> Approved with Comments<br>يعتمد بملاحظات | <input type="checkbox"/> Comply Comments and Resubmit<br>معالجة الملاحظات وإعادة التقديم | <input type="checkbox"/> Rejected<br>مرفوض |       |            |          |
| Name:                                                 | الاسم:                                                            | Signature                                                                                | التوقيع:                                   | Date: | 2024/05/19 | التاريخ: |

Acceptance does not relieve the contractor from his responsibility and liability concerning compliance with the contract requirement.

إن هذه الموافقة لا تعفي المقاول من مسؤولياته تجاه مطابقة متطلبات العقد





شركة طرق الرياض للمقاولات  
RIYADH ROADS CONTRACTING CO.



وزارة الإسكان  
MINISTRY OF HOUSING



مكتب رمك للاستشارات الهندسية  
Office Ramak For Engineering Consultancy

تصميم - إشراف - تخطيط عمراني - إدارة مشاريع

البريد الإلكتروني: info@ramakcompany.com - 0566151766 (الإدارة) - 0544714479 (مدير المشاريع)

## Works Inspection Request - WIR

طلب إستلام أعمال

|                    |                              |           |                      |
|--------------------|------------------------------|-----------|----------------------|
| MIR Serial Number: | ASPHALT WEARING COURSE       | طلب تسليم | الرقم التسلسلي: 0000 |
| Date               | ٢٠٢٤/٠٥/١٩                   |           | التاريخ              |
| Location           | جدة                          |           | المنطقة              |
| Project Title      | مشروع تلال الغروب            |           | إسم المشروع          |
| Consultant         | مكتب رمك للاستشارات الهندسية |           | الإستشاري            |
| Contractor :       | شركة طرق الرياض للمقاولات    |           | المقاول              |

### Part A: By the Contractor:

الجزء (أ): يتم إستكماله من خلال المقاول

#### Attachments (tick as appropriate)

المرفقات

|                                                                                                  |                                                                             |                                                                                       |                                                 |                                               |                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Sketch attached to show the location(s)<br>كروكي توضح الموقع | <input type="checkbox"/> Inspection Check list<br>قائمة الفحص               | <input type="checkbox"/> Surveyor Field Sheet (if any)<br>مجل إستلام الأعمال المساحية |                                                 |                                               |                                                |
| <input type="checkbox"/> Approved Shop Drawing<br>الرسومات التفصيلية المعتمدة                    | <input type="checkbox"/> Test Reports (if any)<br>تقارير اختبارات (إن وجدت) | <input type="checkbox"/> Others(state)<br>أخرى                                        |                                                 |                                               |                                                |
| Discipline: التصنيف                                                                              | <input type="checkbox"/> Civil<br>إنشائي                                    | <input type="checkbox"/> Architectural<br>معماري                                      | <input type="checkbox"/> Mechanical<br>ميكانيكا | <input type="checkbox"/> Electrical<br>كهرباء | <input type="checkbox"/> Other (state)<br>أخرى |

#### Description of Works to be inspected and / or tested:

وصف الأعمال المطلوب تسليمها

### ASPHALT WEARING COURSE

شارع 04

بلوك 11

#### Works Quantity:

We certify that these works has been executed in accordance with the Contract Specifications and Approved Drawings  
شهادة بأن الأعمال المنجزة أعلاه نفذت بحسب مواصفات العقد وحسب المخططات المعتمدة

|       |        |           |          |             |                 |       |          |
|-------|--------|-----------|----------|-------------|-----------------|-------|----------|
| Name: | الاسم: | Signature | التوقيع: | Designation | المسمى الوظيفي: | Date: | التاريخ: |
|-------|--------|-----------|----------|-------------|-----------------|-------|----------|

### Part B: By the Consultant:

الجزء (ب): يتم إستكماله من خلال الإستشاري

#### Site Inspector's Comments:

ملاحظات القائم بالإستلام

|       |        |           |          |             |                 |       |          |
|-------|--------|-----------|----------|-------------|-----------------|-------|----------|
| Name: | الاسم: | Signature | التوقيع: | Designation | المسمى الوظيفي: | Date: | التاريخ: |
|-------|--------|-----------|----------|-------------|-----------------|-------|----------|

#### Witnessed Site Test Results (if any):

نتائج اختبارات الموقع (إن وجدت)

☒

Passed

مقبول

☐

Failed

مرفوض

☐

N/A

لا يوجد

#### Resident Engineer Final Comments & Decision:

ملاحظات مدير المشروع - إستشاري

|                                                       |                                                                   |                                                                                          |                                            |       |          |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Approved<br>يتمتع | <input type="checkbox"/> Approved with Comments<br>يعتمد بملاحظات | <input type="checkbox"/> Comply Comments and Resubmit<br>معالجة الملاحظات وإعادة التقديم | <input type="checkbox"/> Rejected<br>مرفوض |       |          |
| Name:                                                 | الاسم:                                                            | Signature                                                                                | التوقيع:                                   | Date: | التاريخ: |

Acceptance does not relieve the contractor from his responsibility and liability concerning compliance with the contract requirement.

إن هذه الموافقة لا تعفي المقاول من مسؤولياته تجاه مطابقة متطلبات العقد



|                    |                                         |               |            |
|--------------------|-----------------------------------------|---------------|------------|
| Client             | شركة طرق الرياض للمقاولات               | Report No.    | 240463.114 |
| Project            | مشروع البنية التحتية - مخطط تلال الغروب | Sampling Date | 19-5-2025  |
| Location           | جدة - حي الامير فواز                    | Sample by     | Saddam     |
| Sample Description | BITUMINOUS WEARING COURSE LAYER         | Report Date   | 21-5-2025  |
| Station            | STA 0 to STA 214 Street 04 Block 11     | Tested By     | Abdullah   |

Superpave Mix Design Analysis

| Specimen I.D.                      | Bulk Specific Gravity of Compacted Specimen & Volumetric Properties |        |       |        |        |       | Design Criteria |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|--------|-------|-----------------|
|                                    | Ndes                                                                |        |       | Nmax   |        |       |                 |
|                                    | 1                                                                   | 2      | Ave.  | 1      | 2      | Ave   |                 |
| a. Weight in air, dry (gm)         | 4803.5                                                              | 4823.4 |       | 4816.1 | 4818.1 |       |                 |
| b. Weight in air, SSD (gm)         | 4810.3                                                              | 4829.1 |       | 4823.2 | 4823.7 |       |                 |
| c. Weight in water, (gm)           | 2861.2                                                              | 2864.2 |       | 2907.8 | 2910.3 |       |                 |
| d. Volume, (cc)                    | 1949.1                                                              | 1964.9 |       | 1915.4 | 1913.4 |       |                 |
| e. Specific Gravity (Gmb) (a/d)    | 2.464                                                               | 2.455  | 2.460 | 2.514  | 2.518  | 2.516 |                 |
| Height @ Nini                      | 130.0                                                               | 130.0  | 130.0 | 133.0  | 132.0  | 132.5 |                 |
| Height @ Ndes                      | 111.0                                                               | 112.0  | 111.5 | 109.0  | 107.0  | 108.0 |                 |
| Height @ Nmax                      | —                                                                   | —      | —     | 109.0  | 107.0  | 108.0 |                 |
| % Gmm @ Nini                       | 81.5                                                                | 81.9   | 81.7  | —      | —      | —     | 89 MAX          |
| % Gmm @ Ndes                       | 95.5                                                                | 95.1   | 95.3  | —      | —      | —     | 96±2.0          |
| % Gmm @ Nmax                       | —                                                                   | —      | —     | 97.4   | 97.5   | 97.5  | 98 MAX          |
| Air Voids %                        | 4.5                                                                 | 4.9    | 4.7   | 2.6    | 2.5    | 2.5   | 2.5 -5.5%       |
| Voids in Mineral Aggregate (VMA) % | 15.7                                                                | 16.1   | 15.9  | —      | —      | —     | 14min-16max     |
| Voids Filled (VF) %                | 71.1                                                                | 69.4   | 70.2  | —      | —      | —     | 65 - 75         |
| Dust Proportion:                   | 1.15                                                                |        |       |        |        |       | 0.80 - 1.60     |

| Maximum Theoretical Specific Gravity (Gmm)               |         |   |   | Mix properties |        |
|----------------------------------------------------------|---------|---|---|----------------|--------|
| Specimen I.D.                                            | 1       | 2 | 3 | Gb =           | 1.026  |
| a. Net weight of loose mix (gm)                          | 2132.4  |   |   | Gsb =          | 2.771  |
| b. Net weight of flask & water (gm)                      | 9353.0  |   |   | Ps =           | 94.739 |
| c. Net weight of flask, loose mix & water                | 10659.5 |   |   | Gse =          | 2.82   |
| d. Maximum Theoretical Specific Gravity, Gmm (A/(A+B-C)) | 2.582   |   |   | Pba =          | 0.63   |
| e. Average Gmm                                           | 2.582   |   |   | Pbe =          | 4.66   |

| Extraction & Gradation              |            |   | Total weight of Agg: 2097.8 |                    | Sieve analysis  |           |       |
|-------------------------------------|------------|---|-----------------------------|--------------------|-----------------|-----------|-------|
|                                     |            |   | Sieve Size                  | Weight Retained gm | Percent Passing | JMF Limit | Ave.  |
|                                     |            |   | 1-1/2"                      | 0                  | 100.0           | 100.0     | 100.0 |
|                                     |            |   | 1"                          | 0                  | 100.0           | 100       | 100.0 |
|                                     |            |   | 3/4"                        | 0                  | 100.0           | 100       | 100.0 |
| Asphalt Content                     | 1          | 2 | 1/2"                        | 141                | 93.3            | 90 - 98   | 93.3  |
| a. Wt of sample before test, gm     | 2214.3     |   | 3/8"                        | 442                | 78.9            | 74 - 82   | 78.9  |
| b. Wt of sample after test, gm.     | 2097.4     |   | #4                          | 873                | 58.4            | 50 - 60   | 58.4  |
| c. Wt of filter before test, gm     | 31.6       |   | #8                          | 1286               | 38.7            | 32 - 42   | 38.7  |
| d. Wt of filter after test, gm      | 32.0       |   | #16                         | 1506               | 28.2            | 23 - 31   | 28.2  |
| e. Wt of sample in filter (c-d), gm | 0.4        |   | #30                         | 1516               | 27.7            | 16 - 24   | 27.7  |
| f. Wt of total agg, (b+e) gm        | 2097.8     |   | #50                         | 1825               | 13.0            | 10 - 18   | 13.0  |
| g. Wt of Bitumen, (a-f) gm          | 116.5      |   | #100                        | 1888               | 10.0            | 7 - 11    | 10.0  |
| h. Percent AC (g/a x 100), %        | 5.26       |   | #200                        | 1985               | 5.4             | 3.5 - 6.5 | 5.4   |
| i. Average Asphalt Content, %       | 5.26       |   | Pan                         |                    |                 |           |       |
| j. Optimum asphalt Binder content   | 5.0% ± 0.4 |   |                             |                    |                 |           |       |


Lab. Tech  
*[Signature]*



Lab. Eng  
*[Signature]*





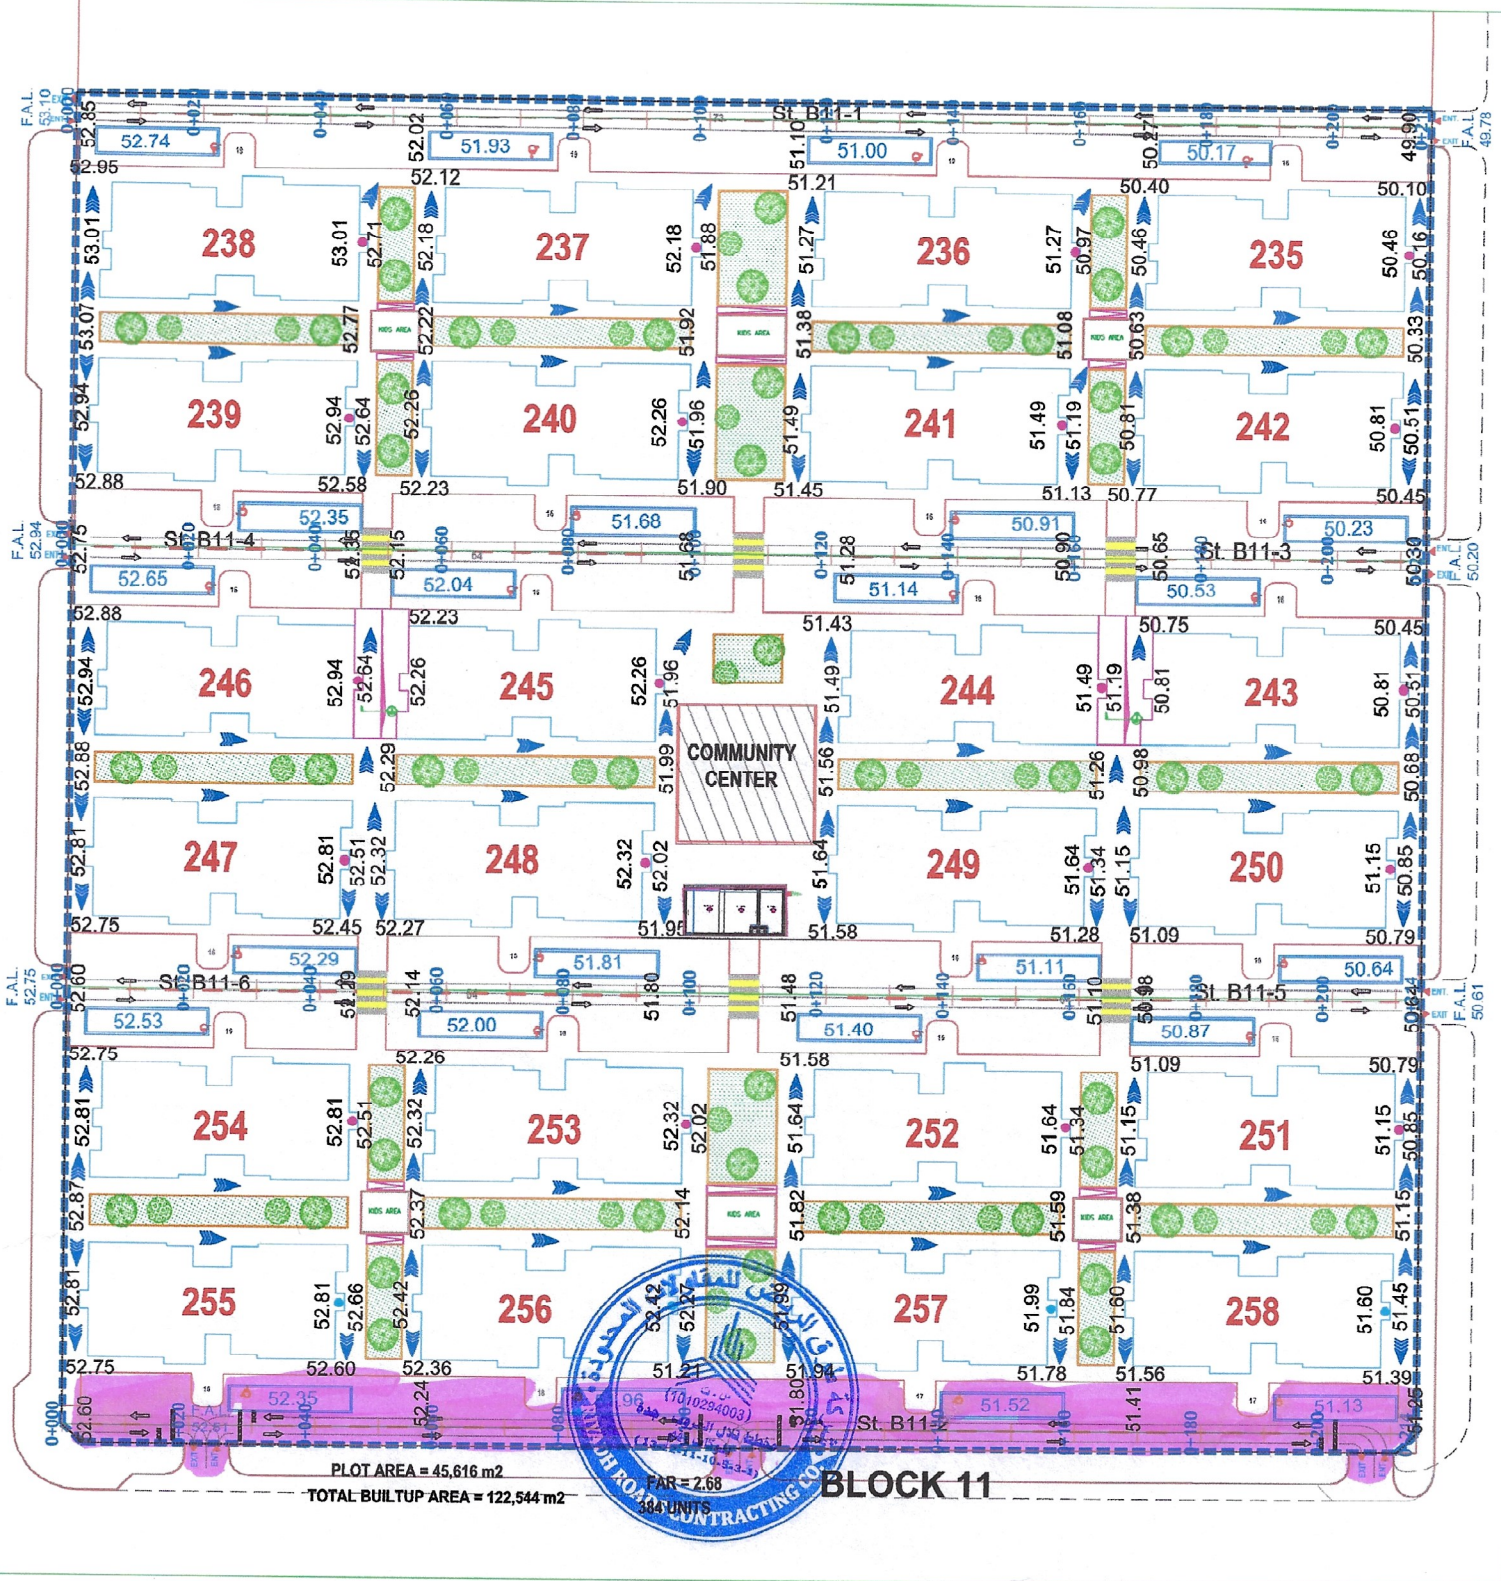

PLOT AREA = 45,616 m2  
 TOTAL BUILTUP AREA = 122,544 m2

FAR = 2.68  
 184 UNITS

**BLOCK 11**

